


Burap 2026 projectenoverzicht verzamelkrediet Waternatuur

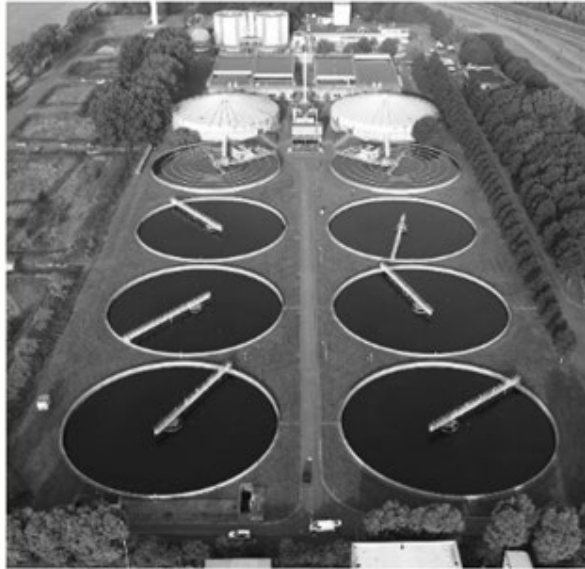

Inhoudsopgave

1. Doelstelling verzamelkrediet Waternatuur	3
2. Wat hebben wij gedaan?	4
3. Financiën in zicht.....	5
4. Projecten in beeld.....	7
NEZ Zeven Gaten (7.02108-002)	7
NEZ De Rel (7.02108-003)	8
NEZ Vlaardingervaart modificatie (7.02108-004)	9
NVO Drijvende oevers Holle Watering (herstel) (7.02108-011)	10
NEZ Gantel de Baak (7.02108-019)	11
NEZ Wennetjessloot (7.02108-021)	12
NEZ Buijs Ballot (7.02108-030).....	13
Golfbreker Woudse Polder (7.02108-034)	14
NEZ Poelzone (herstel) (7.02108-037)	15
5. Planning in perspectief	16
6. Projecten op kaart	19

1. Doelstelling verzamelkrediet Waternatuur

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het beheergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit, een gezonde en prettige leefomgeving én om te voldoen aan de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn die in 2000 van kracht is geworden en tot doel heeft om:

- 1) Het watersysteem voor achteruitgang te behoeden en beschermen.
- 2) Uiterlijk in 2027 een goede ecologische en chemische toestand van oppervlaktewateren te bereiken en te behouden.

De waterkwaliteit voldoet nog niet. Er worden nog te veel schadelijke stoffen aangetroffen in te hoge concentraties én in het watersysteem van Delfland zijn nog te weinig mogelijkheden voor plantengroei (structuur), waardoor macrofauna (insecten) en vissen geen goede leefomgeving hebben. Voor het behalen van de KRW-doelen in 2027 is een ambitieus maatregelenpakket opgesteld. Eén van de maatregelen uit het KRW Programma Delfland 2022-2027 is de aanleg en versterking van het netwerk van Natte Ecologische Zones. Het gaat daarbij om de aanleg van onder andere natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en vissenbossen. Indien een NEZ in een vaarweg wordt gerealiseerd wordt de aanleg gecombineerd met een golfbreker indien nodig.

Voor de planperiodes van de Stroomgebiedsbeheerplannen SGBP2 (2016 – 2021) en SGBP3 (2022-2027) zijn verzamelkredieten beschikbaar gesteld door de Verenigde Vergadering. Voorliggend verzamelkrediet is voor SGBP3. Hieruit worden projecten gefinancierd waarvan de verkenning is gestart in de periode van SGBP3 (vanaf 2022).

In de BURAP 2025 is een besluit genomen de inzet van het verzamelkrediet Waternatuur te verruimen naar overig water (KRW sport 3 wateren).

2. Wat hebben wij gedaan?


Om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren zijn we bezig geweest met de planvorming en realisatie van nieuwe NEZ locaties en herstel van bestaande locaties om het NEZ netwerk verder te ontwikkelen en robuuster te maken.

Tot dusver zijn in 2026 de volgende projecten de volgende nieuwe NEZ projecten (technisch) uitgevoerd of in uitvoering: De Zeven Gaten, De Rel, Woudse Polder en Drijvende oevers Hollewatering. Ook wordt NEZ Gantel de Baak ingeplant in Q2

Verder worden bij de volgende herstelprojecten van bestaande NEZ'en afgerond waarbij de het grondwerk/inplant voor rekening komt van het verzamelkrediet waternatuur: Herstel bestaande NEZ locaties: Strijp Honselersdijk; Buijs Ballot; Zwethkanaal Trambaan-Oost, Nieuwe Water fase 2 en Holierhoekse-, en Zouteveensepolder. De afrondende werkzaamheden aan herstelproject Wennetjessloot (inplant) wordt in Q2 afgerond.

Het herstelproject Poelzone komt in overleg met de tactische laag Watersysteem geheel voor rekening van verzamelkrediet waternatuur, inclusief de vervanging van de golfbreker.

3. Financiën in zicht

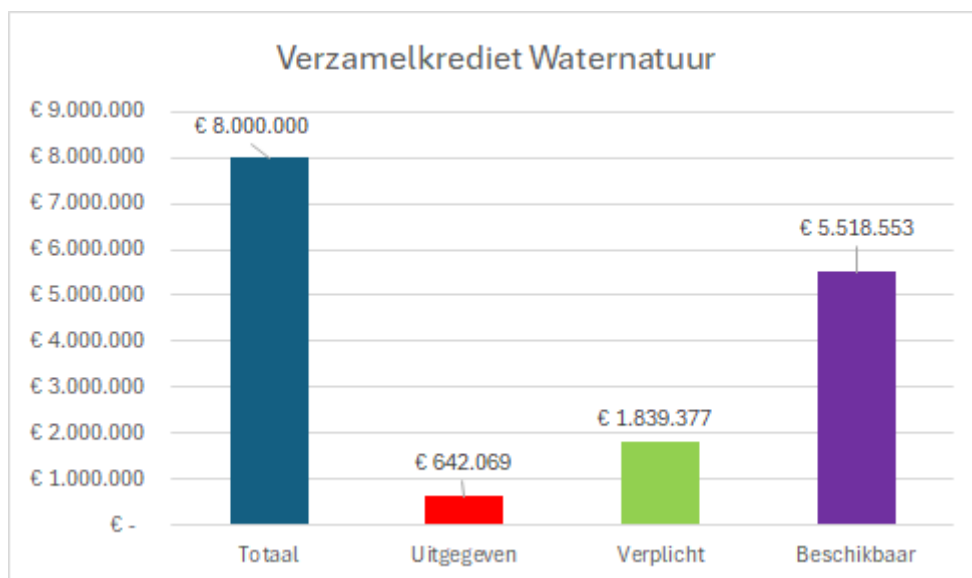

Project	Omschrijving	Actueel krediet	Uitgaven t/m 2025	Kosten 2026	Openst. saldo verplicht.	Prognose uitgaven 2026
0.702108/001	Verzamelkrediet Waternatuur	4.706.294	-	-	-	-
0.702108/002	NEZ Zeven Gaten	276.250	16.244	-	197.393	194.200
0.702108/003	NEZ De Rel	670.000	58.998	170.769	422.250	590.000
0.702108/004	NEZ Vlaardingervaart modificatie	865.000	73.620	-	711.843	400.000
0.702108/005	NVO Lombokstraat	64.156	64.156	-	-	-
0.702108/008	NEZ Slagenlandschap Rijswijk Pasgeld	-	-	-	-	-
0.702108/009	NVO Kadeversterking Kanaalweg/Hoge Noordweg	-	-	-	-	-
0.702108/010	NVO Havenkwartier Rijswijk	-	-	-	-	-
0.702108/011	NVO Drijvende oevers Holle Watering (herstel)	380.000	-	-	345.025	345.000
0.702108/012	NEZ Zanddijk (onverricht laten afsluiten)	-	-	-	-	-
0.702108/014	NEZ Schiedamse Schieoevers (PLV)	-	-	-	-	-
0.702108/015	NEZ Bonnepolder	-	-	-	-	-
0.702108/019	NEZ Gantel de Baak	171.500	26.330	-	-	135.000
0.702108/021	NEZ Wennetjessloot	359.300	231.944	-	49.216	49.220
0.702108/024	Vijvers Rijswijkse Bos en verbinding naar Schie (PLV)	2.500	-	-	2.481	-
0.702108/025	NEZ Laakkanaal vissenbos (PLV)	-	-	-	-	-
0.702108/026	Uitbreiding drijvende oever Fijnjekade (Laakhaven) (PLV)	-	-	-	-	-

0.702108/027	Drijvende oever Petroleumhaven (PLV)	-	-	-	-	-
0.702108/028	NEZ Broeksloot (PLV)	-	-	-	-	-
0.702108/029	NEZ Indische buurt Vlaardingen (Insulinde-, Bangka- en Surinamesingel) (PLV)	-	-	-	-	-
0.702108/030	NEZ Buijs Ballot	130.000	8	-	-	130.000
0.702108/031	NVO Singel Wateringen (PLV)	-	-	-	-	-
0.702108/032	NVO Parklaan De Lier - HK36 (PLV)	-	-	-	-	-
0.702108/033	NEZ Vlaardingsekade (PLV)	-	-	-	-	-
0.702108/034	Golfbreker Woudse Polder	120.000	-	-	111.170	105.000
0.702108/035	NEZ Zwethkanaal Trambaan Oost (Naaldwijk) (herstel)	105.000	-	-	-	-
0.702108/036	NEZ Nieuwe Water fase 2 (herstel)	22.500	-	-	-	18.900
0.702108/037	NEZ Poelzone (herstel)	127.500	-	-	-	0
0.702108/038	NEZ Maalkom Gemaal Holierhoekse en Zoutveense Polder (herstel)	-	-	-	-	13.300
0.702108/039	NEZ Kortebuurt Maassluis (PLV)	-	-	-	-	-
0.702108/040	Drijvende oever Spoorsingel Delft (PLV)	-	-	-	-	-
		8.000.000	471.301	170.769	1.839.377	1.980.620

Het beschikbare saldo wordt de komende periode besteed aan lopende projecten en projecten die nog in de verkenning- en planvormingsfase zitten.

4. Projecten in beeld

NEZ Zeven Gaten (7.02108-002)



Algemeen

NEZ Zeven gaten	
Opgave	
Het realiseren van een NEZ waarmee bestaande wateren wordt beschermd. Hiermee wordt de huidige ecologische waterkwaliteit beschermd en verbeterd in het KRW-lichaam Boezem Waterland.	
Context	
Aanleg van een NEZ.	
Realisatie	
De uitvoering is afgerond in Q1.	

Financiën

Actueel krediet/budget	276.250
Kosten tot en met huidig jaar	16.245
Prognose	194.200

NEZ De Rel (7.02108-003)



Algemeen

De Rel
Opgave
Combinatie tussen ontwikkeling natuur (incl. natuur begraven), verbreding van de Rel en aanleg NEZ. Delfland maakt gebruik van de meekoppelkans natuurproject van Zuid Hollands Landschap.
Context
Samen met ZHL aanleggen van een NEZ, waar ZHL water graaft voor watercompensatie en Delfland het verder aanpast naar een NEZ.
Realisatie
De grondwerkzaamheden zijn door ZHL in Q1 afgerond. Aanleg beplanting is gepland voor Q2

Financiën

Actueel krediet/budget	670.000
Kosten tot en met huidig jaar	229.767
Prognose	590.000

NEZ Vlaardingervaart modificatie (7.02108-004)



Algemeen

Vlaardingervaart
Opgave
Herinrichting van de NEZ / vispaaiplaats. Deze is niet goed aangeslagen in het verleden. Inmiddels is de werkwijze aangepast aan de kennis van nu. Het profiel moet aangepast worden met meer droge delen en op de juiste manier worden ingeplant. Ook wordt het geschikt gemaakt voor rijdend onderhoud i.p.v. varend.
Context
Meer overgangen nat/droog om natuur ruimte te geven. De juiste inplant toepassen.
Realisatie
In voorbereiding. Start uitvoering in Q3.

Financiën

Actueel krediet/budget	865.000
Kosten tot en met huidig jaar	73.620
Prognose	400.000

NVO Drijvende oevers Holle Watering (herstel) (7.02108-011)

Algemeen

NVO Drijvende oevers Holle Watering (herstel)	
Opgave	
De NEZ in de Holle Watering - Kwintseul is een drijvende oever en maakt deel uit van het NEZ netwerk langs specifieke KRW-waterlichamen. Deze locatie vormt een stapsteen en is daarom van groot belang voor het NEZ-netwerk. De bestaande drijvende oever, de pilot versie van 2014, is aan vervanging toe. Hiernaast wordt het aan m2 verder uitgebreid.	
Context	
Vervangen en uitbreiden van de bestaande drijvende oever.	
Realisatie	
De werkzaamheden worden in Q2 afgerond	

Financiën

Actueel krediet/budget	380.000
Kosten tot en met huidig jaar	0
Prognose	345.000

NEZ Gantel de Baak (7.02108-019)



Algemeen

Gantel de Baak
Opgave
Combinatie tussen woningbouwontwikkeling ONW en NEZ locatie, waar de ontwikkelaar water graaft die door Delfland ingericht wordt als een NEZ.
Context
Samenwerking met ontwikkelaar ONW voor de aanleg NEZ en golfbreker.
Realisatie
Realisatie grondwerkzaamheden zijn afgerond in 2025. De NEZ wordt ingeplant in Q2 2026

Financiën

Actueel krediet/budget	171.500
Kosten tot en met huidig jaar	26.330
Prognose	135.000

NEZ Wennetjessloot (7.02108-021)



Algemeen

NEZ Wennetjessloot	
Opgave	
Herinrichting van de NEZ. Deze is niet goed aangeslagen in het verleden. Inmiddels is de werkwijze aanzienlijk verbeterd en wordt hier een golfbreker geplaatst, het profiel aangepast en wordt op de juiste manier ingeplant en beschermd.	
Context	
Herinrichting NEZ in combinatie met mitigerende maatregel.	
Realisatie	
De grondwerkzaamheden zijn gerealiseerd in 2025. Beplanting in Q2 2026.	

Financiën

Actueel krediet/budget	359.300
Kosten tot en met huidig jaar	231.944
Prognose	49.220

NEZ Buijs Ballot (7.02108-030)



Algemeen

NEZ Buijs Ballot	
Opgave	
Deze NEZ is een vispaaiplaats gelegen nabij bedrijventerrein Teylingen in de gemeente Westland. De NEZ is in 2014-2015 aangelegd. In de vispaaiplaats zijn nauwelijks planten aanwezig. Door het herstellen van de vispaaiplaats zal de ecologische waarde van het gebied verder toenemen.	
Context	
Herstel vispaaiplaats waardoor ecologische waarde van het gebied toeneemt.	
Realisatie	
In voorbereiding. Start realisatie in Q3 2026.	

Financiën

Actueel krediet/budget	130.000
Kosten tot en met huidig jaar	8
Prognose	130.000

Golfbreker Woudse Polder (7.02108-034)

Algemeen

Golfbreker Woudse Polder
Opgave
In de Woudse Polder in Den Hoorn wordt een pilot uitgevoerd ter beoordeling van de effectiviteit van verschillende golfbrekers. Een van de golfbrekers moet worden vervangen door een nieuw te testen golfbreker.
Context
Vervangen van een golfbreker.
Realisatie
Uitvoering wordt afgerond in Q2 2026

Financiën

Actueel krediet/budget	120.000
Kosten tot en met huidig jaar	0
Prognose	105.000

NEZ Poelzone (herstel) (7.02108-037)

Algemeen

NEZ Poelzone (herstel)
Opgave
In 2016 zijn tijdelijke golfbrekers aangelegd bij de realisatie van de Poelzone. Er is een risico op achteruitgang van de aquatische zone. Ter plaatse van de vispaaiplaats zijn enkele verondiepingen (onderwatereilandjes) aangebracht die zijn ingeplant met oeverplanten. De vegetatie is gedeeltelijk verdwenen. Als er nu niet ingegrepen wordt, zal waarschijnlijk de overgebleven beplanting ook verdwijnen. De onderwatereilandjes dienen hersteld te worden.
Context
Herstel beplanting.
Realisatie
In voorbereiding.


Financiën

Actueel krediet/budget	127.500
Kosten tot en met huidig jaar	0
Prognose	0

5. Planning in perspectief




6. Projecten op kaart

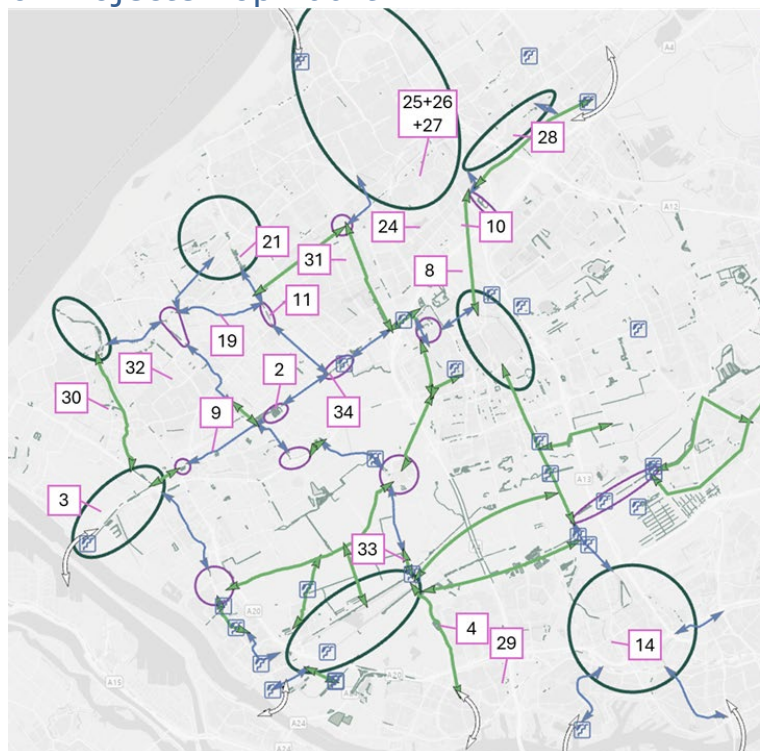

0.702108/002	NEZ Zeven Gaten	2
0.702108/003	NEZ De Rel	2
0.702108/004	NEZ Vlaardingervaart modificatie*	2
0.702108/008	NEZ Slaaglandsluis Rijkswijk Pasveld	2
0.702108/009	NVO Kadeversterking Kanaalweg/Hoge Noordweg	2
0.702108/010	NVO Havenkade Rijkswijk	2
0.702108/011	NVO Drijvende oevers Holle Watering (herstel) (PLV)	2
0.702108/014	NEZ Schiedamsche Schieoevers (PLV)	2
0.702108/019	NEZ Gantel de Baak*	2
0.702108/021	NEZ Wierneijessloot	2
0.702108/022	NEZ Tweemolentjesvaart (voortijdig afgebroken)	2
0.702108/023	NEZ Schie Abtwoudebos (voortijdig afgebroken)	2
0.702108/024	Vijvers Rijkswijkse Bos en verbinding naar Schie (PLV)	2
0.702108/025	NEZ Laakkanaal vissensbos (PLV)	2
0.702108/026	Uitbreiding drijvende oever Fijneijkade (Laakhaven) (PLV)	2
0.702108/027	Drijvende oever Petroleumhaven (PLV)	2
0.702108/028	NEZ Broeksloot (PLV)	2
0.702108/029	NEZ Indische buurt Vlaardingen (Insulinde-, Bangka- en t	2
0.702108/030	NEZ Buijs Ballot	2
0.702108/031	Singel Wateringen (PLV)	2
0.702108/032	De Lier HK36 Parlaan (PLV)	2
0.702108/033	NEZ Vlaardingskade (PLV)	2
0.702108/034	Golfbreker Woudse Polder	2

De nummers op de kaart corresponderen met de volgnummers van de projecten in bovenstaande lijst

Burap 2026 Projectenoverzicht verzamelkrediet Natte Ecologische Zones

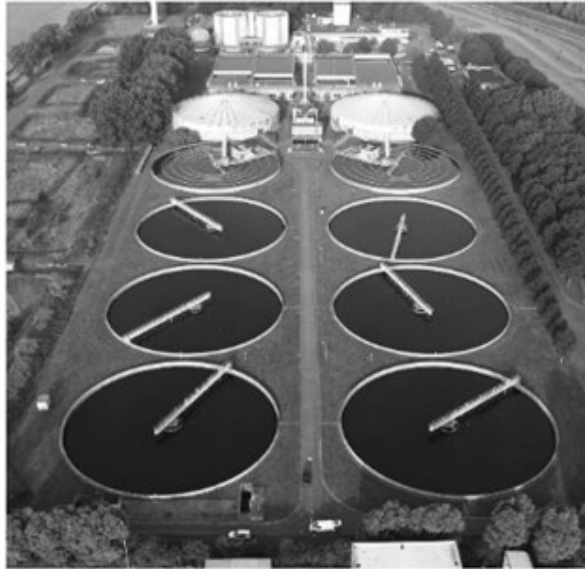

Inhoudsopgave

1. Doelstelling verzamelkrediet Natte Ecologische Zones.....	3
2. Wat hebben wij gedaan?	4
3. Financiën in zicht.....	5
4. Projecten in beeld.....	7
NEZ Groeneweg 177 + Hoogspanningstracé Oranjabuurt (PLV) (7.01956-024)	7
NEZ Nieuweweg/Pouwelslaan (7.01956-025)	8
NEZ Madestein Zuid-West (7.01956-028)	9
NEZ Nieuwe Water (7.01956-030).....	10
5. Planning in perspectief	11
6. Projecten op kaart	12

1. Doelstelling verzamelkrediet Natte Ecologische Zones

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het beheergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit, een gezonde en prettige leefomgeving én om te voldoen aan de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn die in 2000 van kracht is geworden en tot doel heeft om:

- 1) het watersysteem voor achteruitgang te behoeden en beschermen
- 2) uiterlijk in 2027 een goede ecologische en chemische toestand van oppervlaktewateren te bereiken en te behouden.

De waterkwaliteit voldoet nog niet. Er worden nog te veel schadelijke stoffen aangetroffen in te hoge concentraties én in het watersysteem van Delfland zijn nog te weinig mogelijkheden voor plantengroei (structuur), waardoor macrofauna (insecten) en vissen geen goede leefomgeving hebben. Voor het behalen van de KRW-doelen in 2027 is een ambitieus maatregelenpakket opgesteld. Eén van de maatregelen is de aanleg en versterking van het netwerk van Natte Ecologische Zones. Het gaat daarbij om de aanleg van onder andere natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en vissenbossen.

Voor de planperiodes van de Stroomgebiedsbeheerplannen SGBP2 (2016 – 2021) en SGBP3 (2022-2027) zijn hiervoor verzamelkredieten beschikbaar gesteld door de Verenigde Vergadering. Voorliggend verzamelkrediet is voor SGBP2. Hieruit worden projecten gefinancierd waarvan de verkenning en/of planvorming in de periode van SGBP2 (vóór 2022) is gestart en waarvan planvorming en uitvoering nog loopt.


2. Wat hebben wij gedaan?

Om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren hebben we het netwerk van natte ecologische zones (NEZ) verder ontwikkeld.

Na het grondwerk (2025) is ook de inplant van NEZ Madestein Zuidwest ca. 2.35ha afgerond en wordt de inplant van NEZ Nieuwe Water (ca. 0.9ha) in Q2 afgerond.

Voor NEZ locatie NEZ Groeneweg 177+Hoogspanningstracé Oranjebuurt (PLV) zitten we aan het eind van de planvorming. We verwachten deze binnenkort af te ronden, zodat de locatie kan worden overgedragen voor realisatie.

3. Financiën in zicht

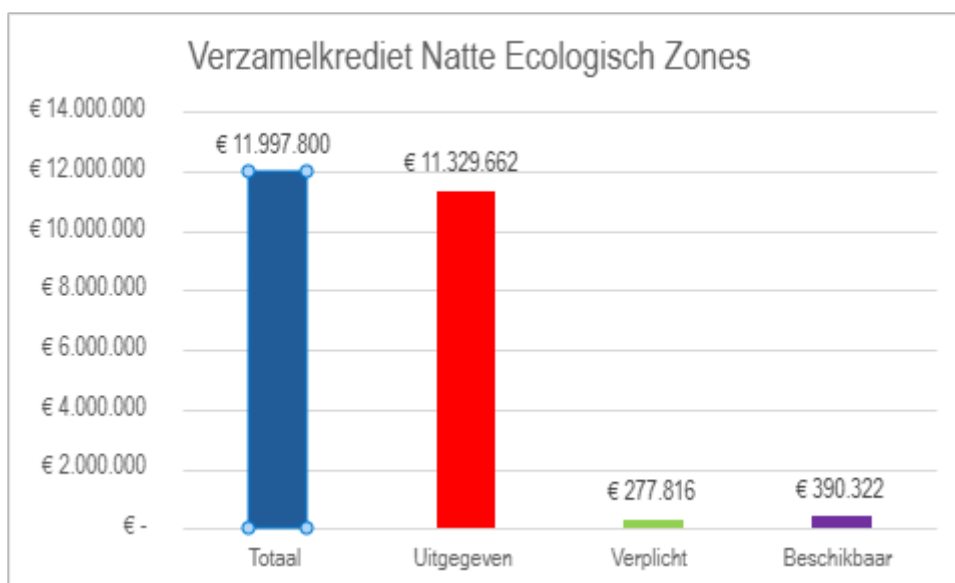

Project	Omschrijving	Actueel krediet	Kosten tm 2025	Kosten 2026	Prognose uitgave 2026	Openst. saldo verplicht.
0.701956/001	Verzamelkrediet Natte ecologische zones 2016-2021	135.883	0			
0.701976/001	Uitwerking ecologische sleutelfactoren	430.025	430.025			
0.702011/001						
0.701956/003 0.701956/007	Uitwerking ecologische sleutelfactoren Uitvoeren wateranalyses	497.194	497.194			
0.701956/009 0.701981/001 0.701998/001	Herprioritering vismigratie-knelpunten 2016-2021 en Prioritering bestaande vispassages	374.918	374.918			
0.701956/026	NEZ Verkenningen	65.925	65.925			
0.701891/001	NEZ Strijp Zuid	182.280	182.280			
0.701917/001	NEZ Gantel - Nieuweweg	144.268	144.268			
0.701956/006	Pilot Drijvende oevers Den Haag	71.797	71.797			
0.701956/013	Vergroening stadsgracht Delft	10.256	10.256			
0.701956/004	NEZ Oostelijke Randweg De Lier	50.171	50.171			
0.701956/008	Vissenbossen Oostboezem	165.525	165.525			
0.701956/020	Vissenbossen Westboezem	154.805	154.805			
0.701956/023	NEZ Dorppolder	25.551	25.551			
0.701973/001	NEZ Polder Biesland	35.684	35.684			
0.701980/001	NEZ Broeksloot Voorburg	3.313	3.313			
0.701974/001	NEZ Boschsloot	10.409	10.409			
0.701995/001	NEZ Groeneweg 179	267.118	267.118			
0.701952/001	NEZ Overhoeken Gantel	16.496	16.496			

0.701956/022	NEZ Rietlanden Woudse Polder	316.517	316.517			
0.701956/021	Plantenkorven	16.170	16.170			
0.701956/015	NEZ Blakervaat	20.650	20.650			
0.701943/001	NEZ watergang Aalkeet Buitenpolder	355.148	355.148			
0.701956/012	Onderzoek groenbeheer en plaag	24.470	24.470			
0.701950/001	NEZ Lierwating KRW/701956	1.167.700	1.167.700			
0.701951/001	NEZ Rotterdamse Schie/701956	614.827	614.827			
0.701956/014	NEZ Gaagweg - Schipluiden	419.038	419.038			
0.701956/002	NEZ Plas Madestein Witte vlek	530.127	530.127			
0.701956/016	NEZ Madestein Noordoost	303.041	303.041			
0.701956/017	NEZ Strijp - Honselersdijk	139.265	139.265			
0.701956/018	NEZ Honderdland	418.939	418.939			
0.701956/024	NEZ Groeneweg 177 + Hoogspanningstracé Zwethkanaal	93.000	36.397	22.243	20.000	3.901
0.701956/025	NEZ Nieuweweg/Pouwelslaan	240.000	162.844	0	39.300	39.291
0.701956/027	NEZ Oude Spui 9	1.488.192	1.488.192			
0.701956/028	NEZ Madestein Zuid-West	1.600.000	1.307.053	3.630	175.000	168.626
0.701956/029	NEZ Waelpark Dijckerwael, fase 1	35.564	35.564			
0.701956/030	NEZ optimalisatie Nieuwe Water	749.000	617.578	0	66.000	65.998
0.701975/001	NEZ Coldenhovelaan/701956	391.519	391.519			
0.701992/001	NEZ Plas Molenweg Berkel	263.973	263.973			
0.701956/035	NEZ Lierwating submerse vegetatie	106.860	106.860			
0.701956/005	NEZ Lookwating	5.614	5.614			
0.701956/036	NEZ Boonervliet	56.569	56.569			
Totaal		11.997.800	11.303.789	25.873	300.300	277.816

Het beschikbare saldo wordt besteed aan de afronding van 4 lopende projecten. Hiermee wordt de benutting van dit verzamelkrediet voor de aanleg van NEZ afgerond. Nieuwe NEZ projecten worden gefinancierd uit het verzamelkrediet Waternatuur.

4. Projecten in beeld

NEZ Groeneweg 177 + Hoogspanningstracé Oranjebuurt (PLV) (7.01956-024)

Algemeen

NEZ Hoogspanningstracé Zwethkanaal
Opgave
Aanleg van een NEZ (Groeneweg 177) die een bijdrage leveren aan het realiseren van habitat voor vegetatie en macrofauna (en vis).
Context
In samenwerking met de gemeente Westland zijn drie percelen beschikbaar gekomen. In de planvorming bleken St. Jorispad 17 en 24, niet interessant vanwege de ligging en grootte. De locatie Groeneweg 177 wordt verder uitgewerkt tot een NEZ.
Realisatie
In Q3 wordt dit project overgedragen naar het projectenbureau voor uitvoering

Financiën

Actueel krediet/budget	93.000
Kosten tot en met huidig jaar	58.640
Prognose	20.000

NEZ Nieuweweg/Pouwelslaan (7.01956-025)



Algemeen

NEZ Nieuweweg/Pouwelslaan	
Opgave	
Het creëren van een volledige stapsteen in het NEZ netwerk	
Context	
Realisatie van een NEZ tussen een jachthaven en een kas in samenwerking met de gemeente Westland.	
Realisatie	
Grondwerk is gerealiseerd in 2025. Beplanting wordt gerealiseerd in 2026.	

Financiën

Actueel krediet/budget	240.000
Kosten tot en met huidig jaar	162.844
Prognose	39.300

NEZ Madestein Zuid-West (7.01956-028)



Algemeen

NEZ Madestein Zuid-West	
Opgave	
Het aanleggen van een NEZ om het kerngebied van Madestein te versterken.	
Context	
Realisatie van natuurvriendelijke oevers, waterplantzones en een vispaaiplaats, i.c.m. de herinrichting van het Landschapspark Vroondaal (trekker is gemeente Den Haag).	
Realisatie	
Grondwerk is gerealiseerd in 2025. Aanleg beplanting is voltooid in Q2	

Financiën

Actueel krediet/budget	1.600.000
Kosten tot en met huidig jaar	1.307.053
Prognose	175.000

NEZ Nieuwe Water (7.01956-030)




Algemeen

Optimalisatie NEZ Nieuwe water	
Opgave	
Optimalisatie op twee cruciale locaties in het NEZ-netwerk.	
Context	
Realisatie van NEZ door herprofilering van de land-waterovergang van de oevers en het verflauwen van het onderwatertalud.	
Realisatie	
Grondwerk is gerealiseerd in 2025. Beplanting wordt gerealiseerd in Q2 2026.	


Financiën

Actueel krediet/budget	749.000
Kosten tot en met huidig jaar	538.614
Prognose	66.000

5. Planning in perspectief

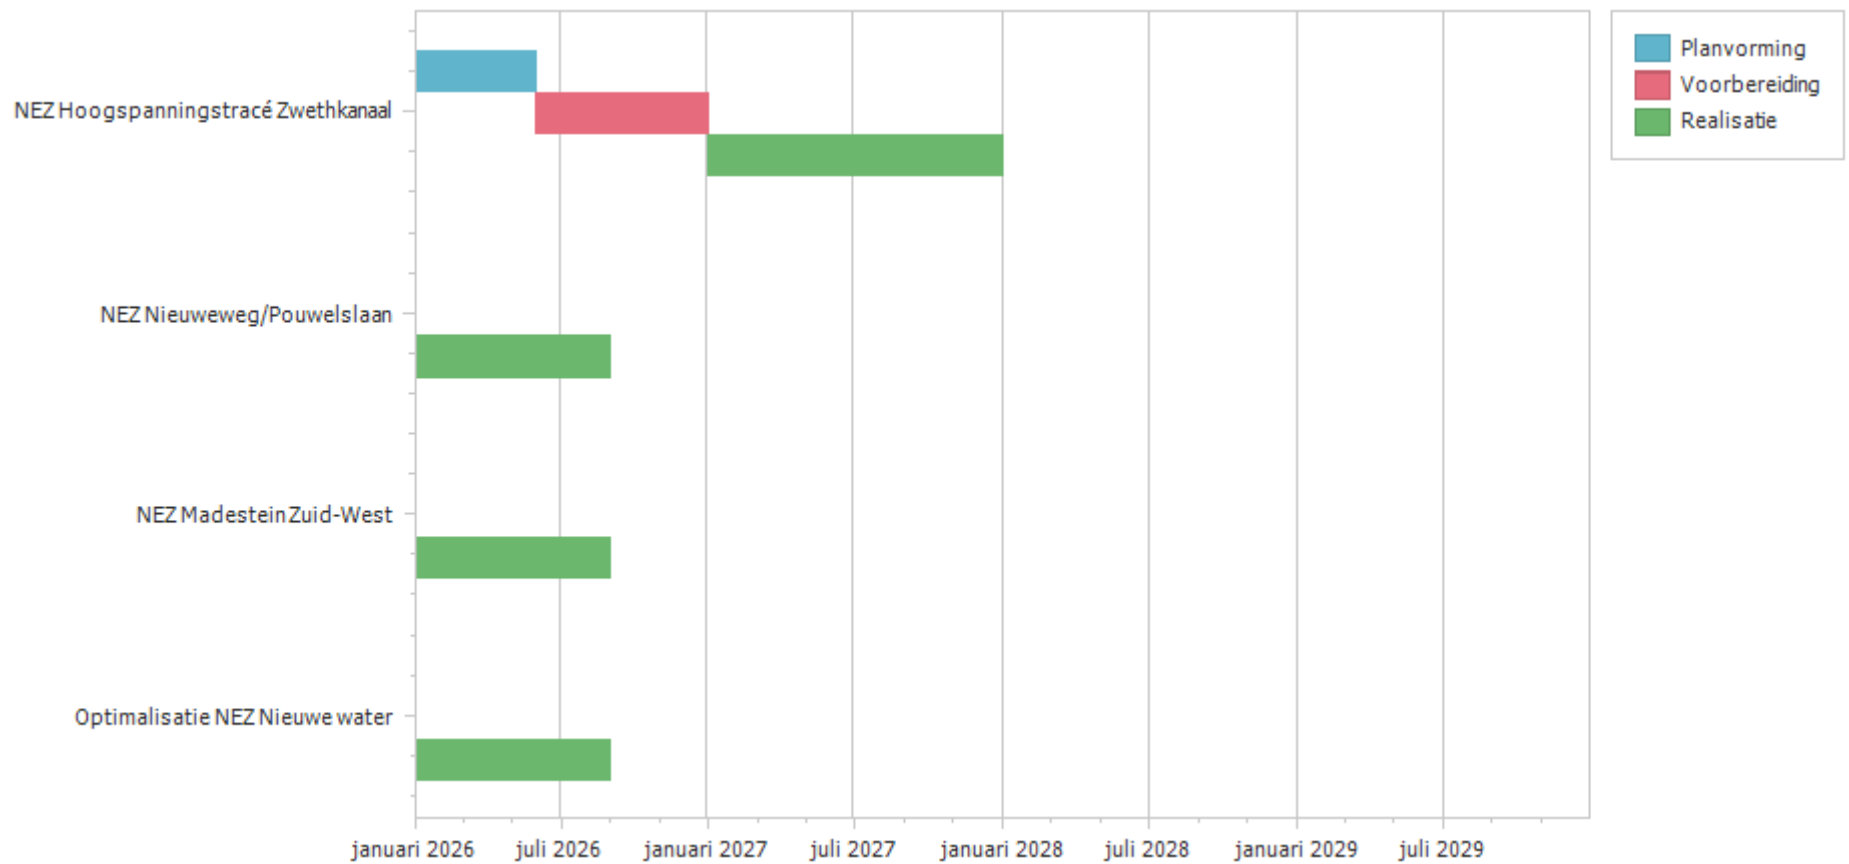

6. Projecten op kaart

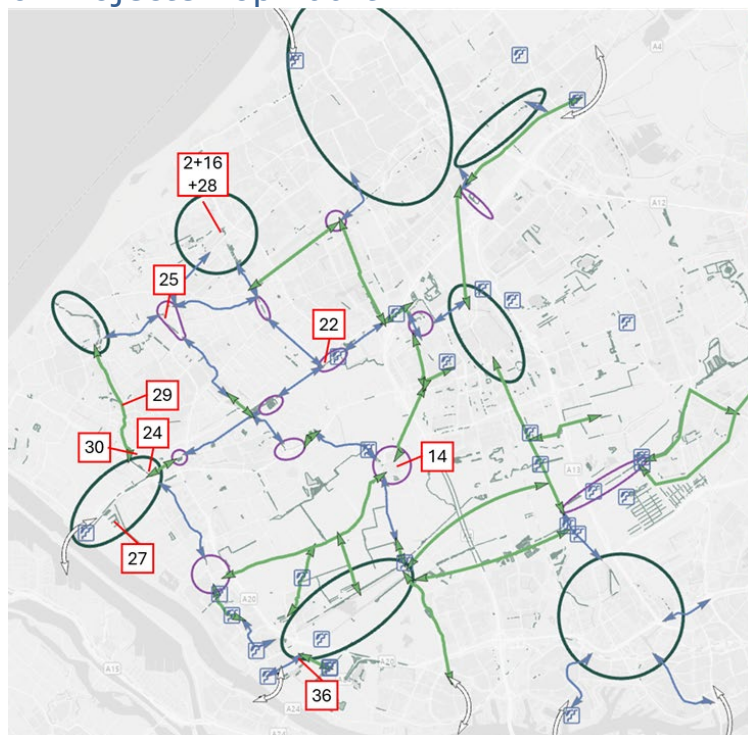


0.701956/002	NEZ Plas Madestein Witte vlek*
0.701956/009	Raamcontract NEZ
0.701956/014	NEZ Gaagweg - Schipluiden (afgerond)
0.701956/016	NEZ Madestein Noordoost (afgerond)
0.701956/022	NEZ Rietland Woudse Polder
0.701956/024	NEZ Groeneweg 177 + Hoogspanningstracé Oranjebuur
0.701956/025	NEZ Nieuweweg/Pouwelslaan*
0.701956/026	NEZ Verkenningen
0.701956/027	NEZ Oude Spui (afgerond)*
0.701956/028	NEZ Madestein Zuid-West
0.701956/029	NEZ Waelpark Dijkenwael, fase 1 (afgerond)
0.701956/030	NEZ Nieuwe Water*
0.701956/036	NEZ Boonervliet (afgerond)

De nummers op de kaart corresponderen met de volgnummers van de projecten in bovenstaande lijst

Burap 2026 projectenoverzicht verzamelkrediet

Mitigerende maatregelen

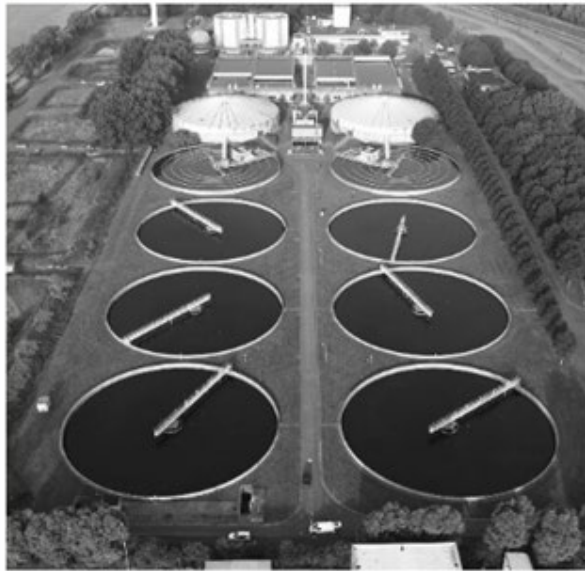

Inhoudsopgave

1. Doelstelling verzamelkrediet Mitigerende maatregelen	3
2. Wat hebben wij gedaan?	4
3. Financiën in zicht.....	5
4. Projecten in beeld.....	6
NEZ Wennetjessloot Golfbreker (7.02107-008).....	6
NEZ Nieuwe Water Golfbreker (7.02107-009)	7
NEZ Kartitaatmolensloot GOLFBREKER (herstel) (7.02107-011).....	8
NEZ De Strijp Honselersdijk GOLFBREKER (herstel) (7.02107-012)	9
NEZ Nieuwe Water fase 2 GOLFBREKER (herstel) (7.02107-013)	10
NEZ Maalkom gemaal Holierhoekse en Zoutveense Polder GOLFBREKER (7.02107-014)	11
NEZ Zwethkanaal Trambaan Oost Naaldwijk GOLFBREKER (herstel) (7.02107-015)	12
6. Planning in perspectief	13
7. Projecten op kaart	14

1. Doelstelling verzamelkrediet Mitigerende maatregelen

Delfland werkt aan schoon, gezond water in het hele beheergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit, een gezonde en prettige leefomgeving én om te voldoen aan de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn die in 2000 van kracht is geworden en tot doel heeft om:

- 1) Het watersysteem voor achteruitgang te behoeden en beschermen
- 2) Uiterlijk in 2027 een goede ecologische en chemische toestand van oppervlaktewateren te bereiken en te behouden.

De waterkwaliteit voldoet nog niet. Er worden nog te veel schadelijke stoffen aangetroffen in te hoge concentraties én in het watersysteem van Delfland zijn nog te weinig mogelijkheden voor plantengroei (structuur), waardoor macrofauna (insecten) en vissen geen goede leefomgeving hebben. Voor het behalen van de KRW-doelen in 2027 is een ambitieus maatregelenpakket opgesteld. Eén van de maatregelen uit het KRW Programma Delfland 2022-2027 is de aanleg en versterking van het netwerk van Natte Ecologische Zones. Het gaat daarbij om de aanleg van onder andere natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en vissenbossen.


Het ecologisch netwerk en het vaarnetwerk van Delfland overlappen ongeveer 80%. Dit betekent dat bij ongeveer 80% van alle natuurvriendelijke oevers (NVO's) in ons beheergebied gemotoriseerd wordt gevaren. Bij natuurvriendelijke oevers in watergangen met vaarverkeer meten we een negatief effect op de vegetatie in de oeverzone; hierdoor dragen de NVO's minder bij aan het halen van de KRW-doelstellingen. Door het plaatsen van een oeverbescherming bij een NVO, kan dit negatieve effect worden verminderd.

Het verminderen van dit negatieve effect is eveneens een maatregel uit het KRW Programma Delfland 2022-2027 en hiervoor is een separaat verzamelkrediet beschikbaar gesteld door de Verenigde Vergadering. Dit projectenboek gaat over deze mitigerende maatregelen.

2. Wat hebben wij gedaan?

Begin 2026 zijn er meerder in opdracht gegeven voor het realiseren van een vooroever en/of vraatbescherming.

3. Financiën in zicht

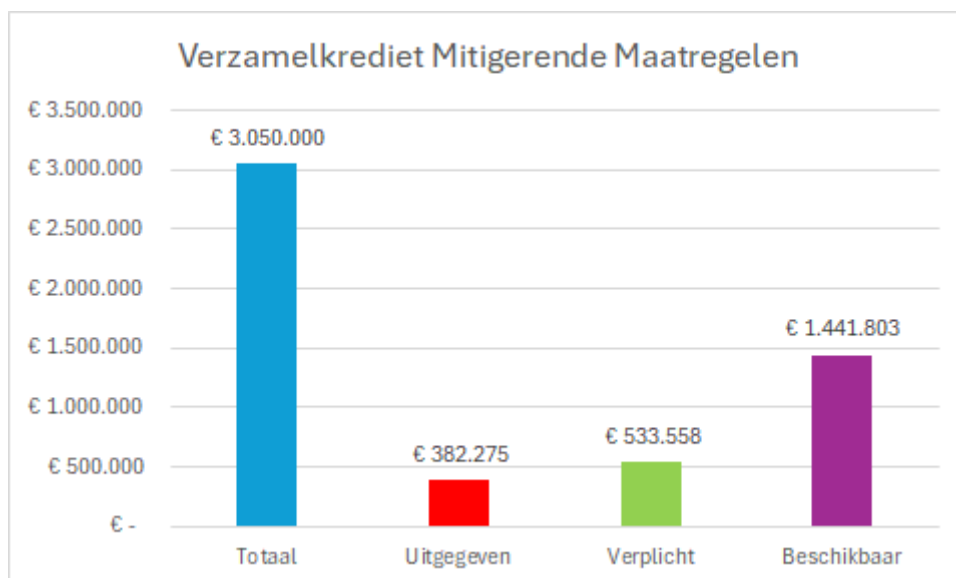

Project	Omschrijving	Actueel krediet	Uitgaven t/m 2025	Kosten 2026	Openst. saldo verplicht.	Prognose uitgave 2026
0.702107/001	Verzamelkrediet Mitigerende Maatregelen	1.229.774	0	0	0	0
0.702107/nvt	Verzamelkrediet afgesloten	468.026	0	0	0	0
0.702107/008	NEZ Wennetjessloot Golfbreker	489.700	376.830	0	43.803	43.803
0.702107/011	NEZ Karitaatmolensloot (herstel)	70.000	0	0	0	50.000
0.702107/012	NEZ De Strijp Honselersdijk (herstel)	230.000	0	0	205.788	206.000
0.702107/013	Golfbreker Nieuwe Water fase 2	137.500	0	0	130.536	125.000
0.702107/014	NEZ Maalkom gemaal Holierhoekse en Zoutveense Polder (herstel)	195.000	0	0	0	175.000
0.702107/015	Golfbreker Zwethkanaal Trambaan Oost Naaldwijk (herstel)	230.000	0	5.445	153.431	192.000
0.702107/016	Golfbreker Poelzone (herstel)	0	0	0	0	650.000
0.702107/017	NEZ Oude Campsweg (herstel)	0	0	0	0	0
0.702107/018	NEZ Casembrootlaan (herstel)	0	0	0	0	0
0.702107/019	NEZ Noordvliet (herstel)	0	0	0	0	0
Totaal		3.050.000	376.830	5.445	533.558	1.441.803

4. Projecten in beeld

NEZ Wennetjessloot Golfbreker (7.02107-008)



Algemeen

NEZ Wennetjessloot Golfbreker (AFGEROND)	
Opgave	
Toepassen van nieuwe verbeterde golfbreker.	
Context	
Na het onderzoek bij Woudse polder is de keuze gemaakt welk type golfbreker het beste kan worden toegepast. Voor deze locatie is gekozen om gebonden wiepen te gebruiken als bescherming tegen golfslag.	
Realisatie	

Financiën

Actueel krediet/budget	489.700
Kosten tot en met huidig jaar	376.830
Prognose	43.803

NEZ Nieuwe Water Golfbreker (7.02107-009)



Algemeen

NEZ Nieuwe Water Golfbreker (= AFGEROND)	
Opgave	
Toepassen van een golfbreker	
Context	
Langs Het Nieuw Water in de gemeente Westland zijn in het verleden (2024) NEZzen aangelegd in de vorm van natuurlijke oevers. De vegetatie langs en in de watergang Het Nieuwe Water bleek helaas niet goed te zijn aangeslagen. Dit is inmiddels hersteld, een onderdeel hiervan was het aanbrengen van een golfbreker.	
Realisatie	

Financiën

Actueel krediet/budget	182.000
Kosten tot en met huidig jaar	160.305
Prognose	65.000

NEZ Kartitaatmolensloot GOLFBREKER (herstel) (7.02107-011)



Algemeen

NEZ Karitaatmolensloot (GOLFBREKER) herstel	
Opgave	
Toepassen van vraatbescherming ter bescherming van de NEZ.	
Context	
Langs de oever van de primaire polderwatergang "de Karitaatmolensloot" ligt een Natte Ecologische Zone (NEZ). In de afgelopen jaren heeft de NEZ zich echter niet goed ontwikkeld naar grote waarschijnlijkheid ten gevolge van vraat van karpers en ganzen. Om verdere schade te voorkomen en de ecologische waarde van het gebied te herstellen, is het noodzakelijk om kale plekken van de NEZ in te planten en voor een periode van 3 jaar te voorzien van vraatbescherming. Het beoogde resultaat is nu een robuuste Natte Ecologische Zone die bijdraagt aan het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).	
Realisatie	
In voorbereiding.	

Financiën

Actueel krediet/budget	70.000
Kosten tot en met huidig jaar	0
Prognose	50.000

NEZ De Strijp Honselersdijk GOLFBREKER (herstel) (7.02107-012)



Algemeen

NEZ de Strijp Honselersdijk GOLFBREKER (herstel)	
Opgave	
Toepassen van een nieuwe verbeterde golfbreker.	
Context	
Langs de oever van de primaire boezemwatergang "de Strijp" ligt een Natte Ecologische Zone (NEZ) met een bijbehorende golfbreker. In de afgelopen jaren heeft de NEZ zich echter niet goed ontwikkeld en is de staat van de golfbreker sterk verslechterd. Als gevolg hiervan is het buitentalud van de aangrenzende regionale waterkering begonnen af te kalven. Om verdere schade te voorkomen en de ecologische waarde van het gebied te herstellen, is het noodzakelijk om de NEZ te herstellen en de golfbreker te vervangen. Het beoogde resultaat is een robuuste Natte Ecologische Zone die bijdraagt aan het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), én een goed beschermde waterkering die bestand is tegen afkalving.	
Realisatie	
Uitvoering is gestart in Q1-2026.	

Financiën

Actueel krediet/budget	340.000
Kosten tot en met huidig jaar	0
Prognose	206.000

NEZ Nieuwe Water fase 2 GOLFBREKER (herstel) (7.02107-013)



Algemeen

NEZ Nieuwe Water fase 2 Golfbreker (herstel)	
Opgave	
Herstellen van een golfbreker.	
Context	
Langs de oever van de primaire boezemwatergang "Het Nieuwe Water" ligt een Natte Ecologische Zone (hierna: NEZ) met een bijbehorende golfbreker. In de afgelopen jaren heeft de NEZ zich niet goed ontwikkeld en is de staat van de golfbreker sterk verslechterd. Om de ecologische waarde van het gebied te herstellen, is het noodzakelijk om de NEZ te herstellen en de golfbreker te vervangen. Het beoogde resultaat is een robuuste Natte Ecologische Zone met bijbehorende beschermende NEZ, die bijdragen aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).	
Realisatie	
In voorbereiding.	

Financiën

Actueel krediet/budget	137.500
Kosten tot en met huidig jaar	0
Prognose	125.000

NEZ Maalkom gemaal Holierhoekse en Zoutveense Polder GOLFBREKER
(7.02107-014)



Algemeen

NEZ Maalkom gemaal Holierhoekse en Zouteveensepolder GOLFBREKER (herstel)	
Opgave	
Toepassen van een nieuwe verbeterde golfbreker.	
Context	
Langs de oever van de primaire polderwatergang "de Slinksloot" ligt een Natte Ecologische Zone (hierna: NEZ) met een bijbehorende golfbreker. In de afgelopen jaren heeft de NEZ zich niet goed ontwikkeld en is de staat van de golfbreker sterk verslechterd. Om de ecologische waarde van het gebied te herstellen, is het noodzakelijk om de NEZ te herstellen en de golfbreker te vervangen. Het beoogde resultaat is een robuuste Natte Ecologische Zone, die bijdraagt aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).	
Realisatie	
In voorbereiding.	

Financiën

Actueel krediet/budget	195.000
Kosten tot en met huidig jaar	0
Prognose	175.000

NEZ Zwethkanaal Trambaan Oost Naaldwijk GOLFBREKER (herstel) (7.02107-015)




Algemeen

Zwethkanaal Trambaan Oost Naaldwijk GOLFBREKER (herstel)	
Opgave	
Toepassen van een nieuwe verbeterde golfbrekers.	
Context	
Langs de oever van primaire boezemwatergang "het Zwethkanaal" liggen Natte Ecologische Zones (hierna: NEZ) met bijbehorende golfbrekers. In de afgelopen jaren hebben de NEZ'en zich niet goed ontwikkeld en is de staat van de golfbrekers sterk verslechterd. Om de ecologische waarde van het gebied te herstellen, is het noodzakelijk om de NEZ'en te herstellen en de golfbrekers te vervangen. Het beoogde resultaat zijn robuuste Natte Ecologische Zones met bijbehorende beschermende golfbrekers, die bijdragen aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).	
Realisatie	
In voorbereiding.	

Financiën

Actueel krediet/budget	230.000
Kosten tot en met huidig jaar	0
Prognose	192.000

6. Planning in perspectief

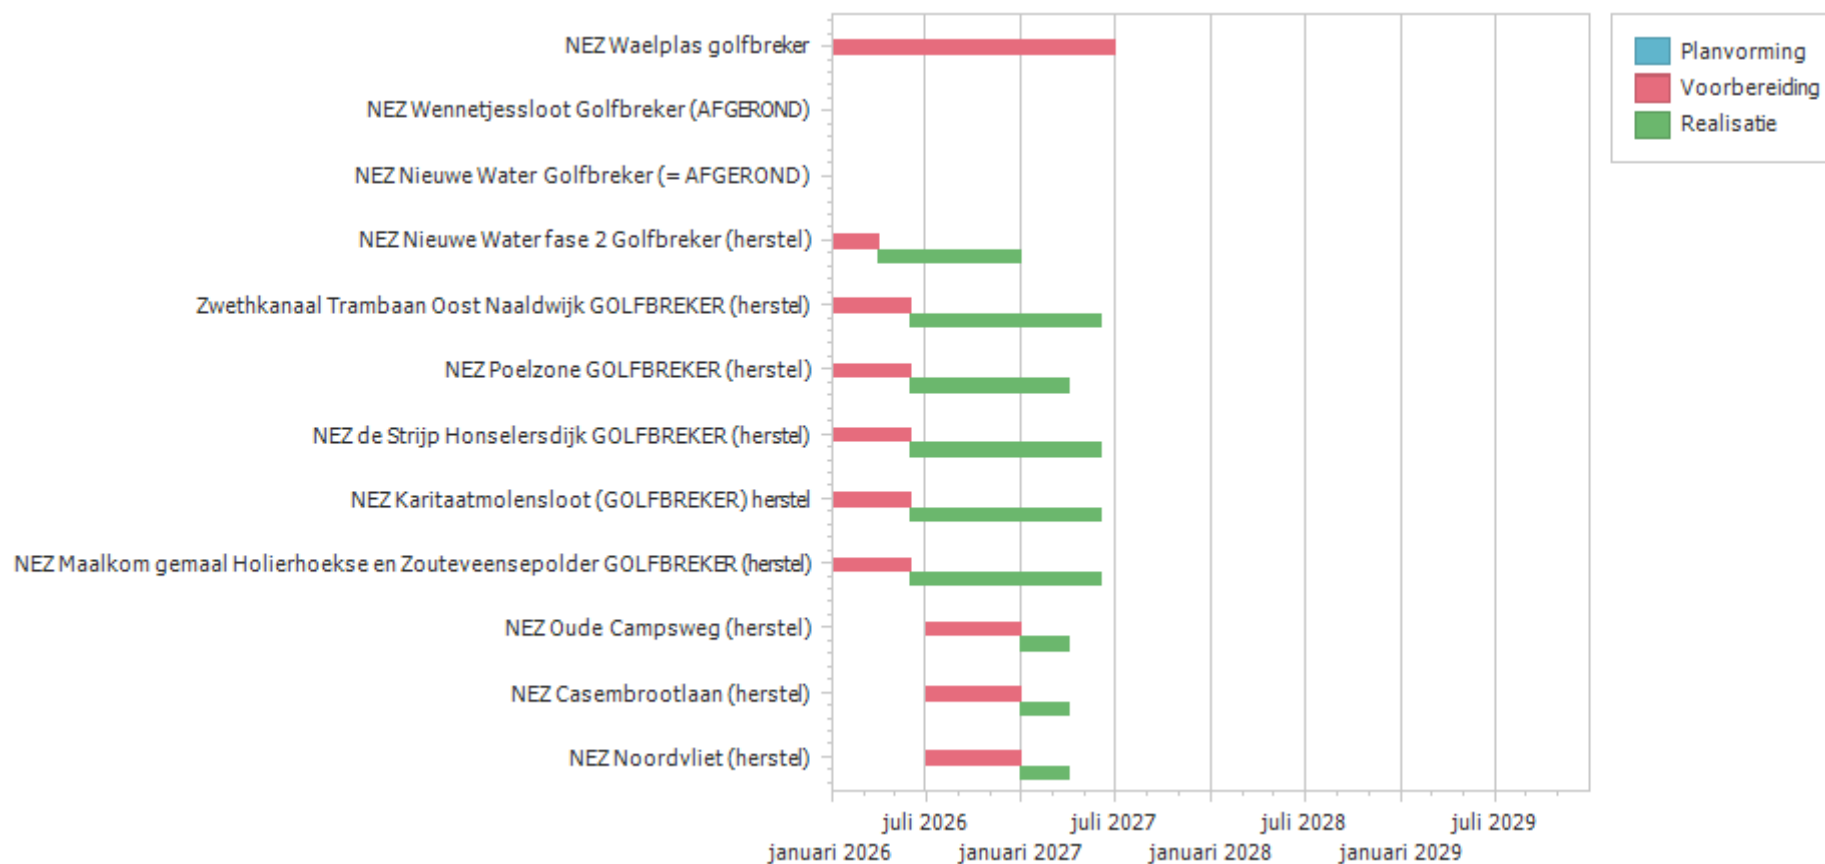


7. Projecten op kaart



1. Diickerwael
2. Woudsepolder
3. Herstel 3 NEZ
4. Wennetjessloot
5. 't Nieuwe Water

Burap 2026 Projectenoverzicht verzamelkrediet Vismigratie

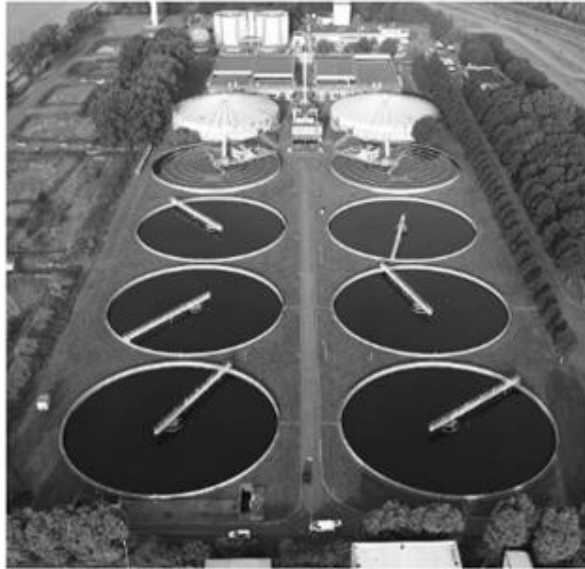

Inhoudsopgave

1. Doelstelling verzamelkrediet Vismigratie	3
2. Wat hebben wij gedaan?	4
3. Financiën in zicht.....	5
4. Projecten in beeld.....	6
Vispassage Gemaal Tedingerbroekpolder (7.02106-002).....	6
Vispassage Oude Lierpolder (7.02106-003).....	7
Vispassage Duifpolder (7.02106-004)	8
Vispassage Hoekpolder (7.02106-005).....	9
5. Planning in perspectief	10
6. Projecten op kaart	11

1. Doelstelling verzamelkrediet Vismigratie

Delfland werkt aan schoon, gezond water in heel het beheergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit, een gezonde en prettige leefomgeving én om te voldoen aan de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn die in 2000 van kracht is geworden en tot doel heeft om:

- 1) het watersysteem voor achteruitgang te behoeden en beschermen
- 2) uiterlijk in 2027 een goede ecologische en chemische toestand van oppervlaktewateren te bereiken en te behouden.


Binnen Delfland is er ook sprake van losse projectkredieten voor vismigratie. Deze kredieten zijn in het verleden toegewezen aan locaties waar er sprake is van complete nieuwbouw van een gemaal (gemaal Commandeurspolder, gemaal Bergsluis). Deze vispassages zijn niet opgenomen in dit projectenboek. Het zelfde geldt voor de nieuw te realiseren vispassage bij gemaal Dorppolder.

2. Wat hebben wij gedaan?

Afgelopen maanden hebben de laatste werkzaamheden plaats gevonden aan de vispassage bij gemaal Teddingerbroekpolder. De fysieke vispassage is inmiddels gereed en wordt nu ingeregeld in het WBS.

De vispassage Hoekpolder zal naar verwachting grotendeels gerealiseerd worden in 2026 en voor vispassage Duifpolder is voorlopig ontwerp in Q1 afgerond en daarmee klaar om te starten met het aanbestedingstraject. De verwachting is dat de realisatie hoofdzakelijk zal plaatsvinden in 2027.

3. Financiën in zicht

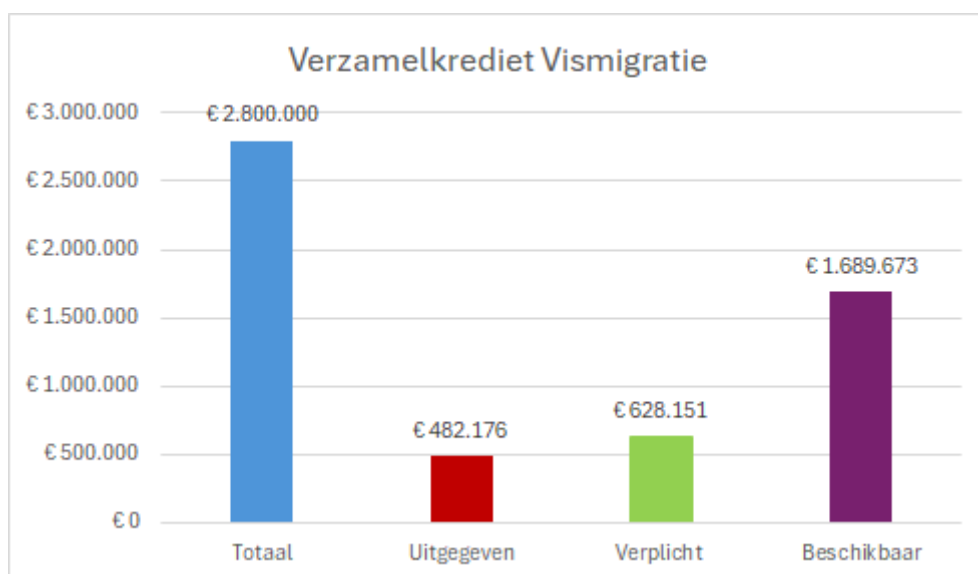

Delfland realiseert in SGPB3 in totaal 10 nieuwe vismigratievoorzieningen en geeft daarmee invulling aan de afspraak met Brussel. Delfland onderzoekt of en waar in de toekomst eventuele nieuwe vismigratiepunten moeten worden gerealiseerd.

Project-nummer	Projectnaam	Actueel krediet	Kosten tm 2025	Gerealiseerde kosten 2026	Openst. (harde) verplicht.	Prognose 2026
0.702106/001	Verzamelkrediet	615.000	0	0	0	0
0.702106/002	Vispassage Gemaal Tedingebroekpolder	615.000	414.936	0	198.444	198.445
0.702106/003	Vispassage Oude Lierpolder	490.000	12.122	47.432	429.707	432.000
0.702106/004	Vispassage Duifpolder	580.000	3.835	0	0	50.000
0.702106/005	Vispassage Hoekpolder	500.000	3.851	0	0	400.000
Totaal		2.800.000	434.744	47.432	628.151	1.080.445

4. Projecten in beeld

Vispassage Gemaal Tedingerbroekpolder (7.02106-002)



Algemeen

Tedingerbroekpolder	
Opgave	
Aanleg vispassage.	
Context	
Wordt samen opgepakt met de renovatie van het gemaal Tedingerbroekpolder.	
Realisatie	
In afronding	

Financiën

Actueel krediet/budget	615.000
Kosten tot en met huidig jaar	414.936
Prognose 2026	198.445

Vispassage Oude Lierpolder (7.02106-003)



Algemeen

Oude Lierpolder	
Opgave	
Aanleg vispassage enkelzijdig.	
Context	
Bestaande pompen zijn als visvriendelijk beoordeeld.	
Realisatie	
In voorbereiding	

Financiën

Actueel krediet/budget	490.000
Kosten tot en met huidig jaar	12.122
Prognose 2026	432.000

Vispassage Duifpolder (7.02106-004)



Algemeen

Vispassage Duifpolder	
Opgave	
Aanleg van een enkelzijdig vispassage t.b.v. vismigratie	
Context	
De vispassage wordt gerealiseerd in combinatie met de aanleg van een krooshekreiniger op deze locatie.	
Realisatie	
Start realisatie	

Financiën

Actueel krediet/budget	580.000
Kosten tot en met huidig jaar	3.835
Prognose 2026	50.000

Vispassage Hoekpolder (7.02106-005)




Algemeen

Hoekpolder
Opgave
Aanleg vispassage t.b.v. de vismigratie
Context
-
Realisatie
In voorbereiding.


Financiën

Actueel krediet/budget	500.000
Kosten tot en met huidig jaar	3.851
Prognose 2026	400.000

5. Planning in perspectief

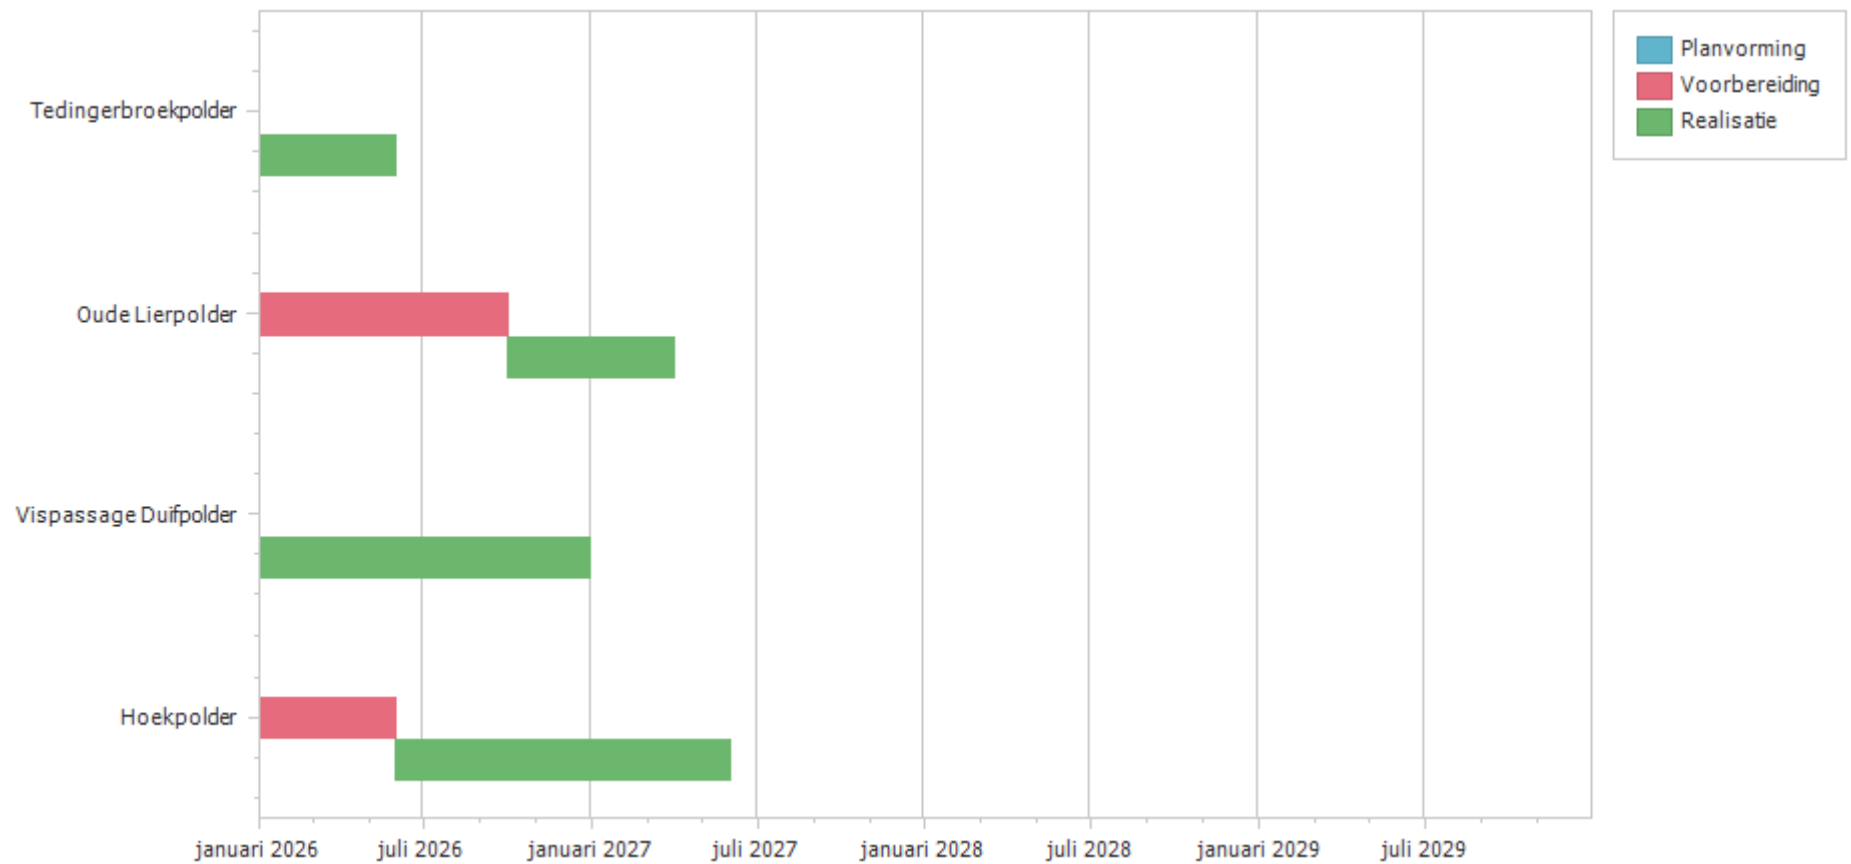

6. Projecten op kaart

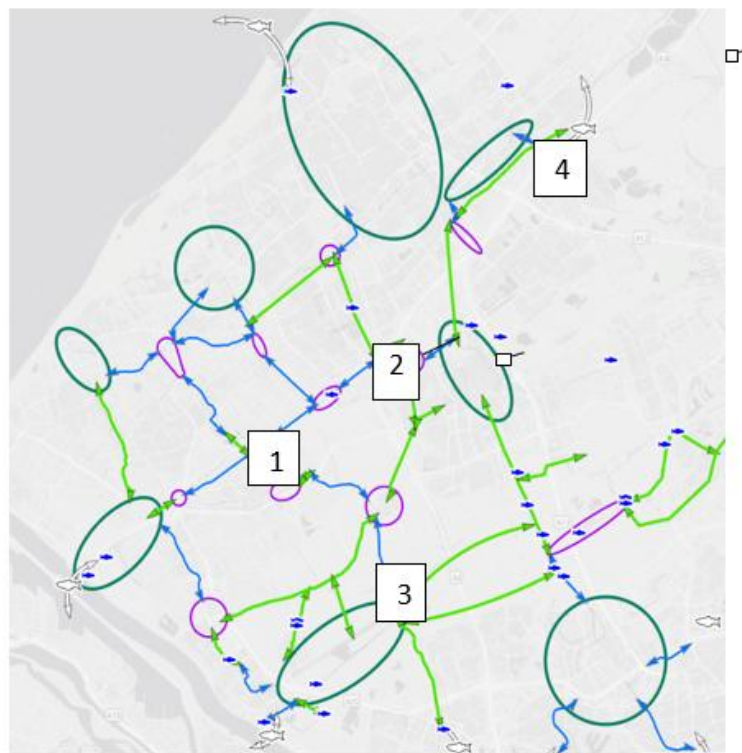

Legenda:

- = Groene corridors
- = Watergangen zonder ecologische inrichting
- = Stapstenen
- = Locaties van kerngebieden

1. Vispassage Oude Lierpolder
2. Vispassage Hoekpolder
3. Vispassage Duifpolder
4. Vispassage Tedingebroekpolder
